

# INFORME DE GESTIÓN

ANTE EL HONORABLE CONCEJO

## ALUMBRADO PÚBLICO I TRIMESTRE 2017 (Enero - Febrero - Marzo)



# TABLA DE CONTENIDO

La Oficina de Alumbrado Público presenta el informe del PRIMER Trimestre de Gestión del Año 2017



**MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO – PROYECTOS EN EJECUCIÓN.**

**MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO – PROCESOS ADJUDICADOS Y/O EN PAGINA SECOP.**

**MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y PODAS**



# MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN ALUMBRADO PROYECTOS EN EJECUCIÓN

**TRAMO 10 AUTOPISTA GIRÓN –  
BUCARAMANGA**


**CENFER – PUERTA DEL SOL**

**BARRIO BAVARA II**

**VILLA DEL PRADO**

## MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

MES	PQR'S RECIBIDAS EN EL MES	PQR'S ATENDIDAS DEL MES	TIEMPO DE RESPUESTA (DIAS)	PQR'S ATENDIDAS DE OTROS MESES
Enero	1160	1037	2	109
Febrero	1029	970	2	129
Marzo	1188	1023	2	59
<b>TOTAL</b>	<b>3.377</b>	<b>3.030</b>		<b>51</b>
<b>TOTAL PQR'S RECIBIDAS I TRIMESTRE 2017</b>				<b>3.377</b>
<b>TOTAL PQR'S ATENDIDAS I TRIMESTRE 2017</b>				<b>3.081</b>

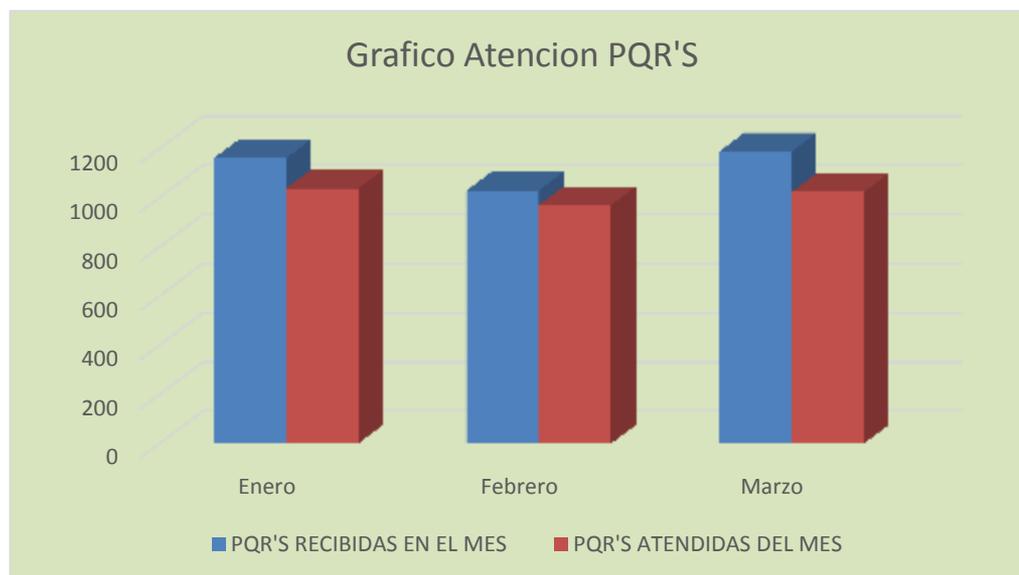

# CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIA CENFER – PUERTA DEL SOL



## GRUPO 1

**CENFER – INTERCAMBIADOR EL BUENO**

**COP:** 003 de 2017  
**Valor:** \$ 3.296.758.330  
**Fecha de Inicio:** Febrero 15 de 2017  
**Fecha de Terminación:** Julio 14 de 2017  
**Porcentaje Ejecución:** 30%  
**Contratista:** EME INGENIERIA S.A.

# CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO VIA CENFER – PUERTA DEL SOL



## GRUPO 2

**INTERCAMBIADOR EL BUENO – INTERCAMBIADOR  
PUERTA DEL SOL**

<b>COP.</b>	<b>004 de 2017</b>
<b>Valor:</b>	<b>\$ 2.881.620.453</b>
<b>Fecha de Inicio:</b>	<b>Febrero 15 de 2017</b>
<b>Fecha de Terminación:</b>	<b>Julio 14 de 2017</b>
<b>Porcentaje Ejecución:</b>	<b>10%</b>
<b>Contratista:</b>	<b>CONSORCIO ECOENERGY</b>

# PARQUE GUAYACANES - BAVARIA II – COMUNA 1 Y VILLA DEL PRADO – COMUNA 5



**COP.** 008 de 2017  
**Valor:** \$ 1.239.726.530  
**Contratista:** CONSORCIO ECOENERGY  
**Fecha de Inicio:** Febrero 16 2017  
**Fecha de Terminación:** Julio 15 de 2017  
**Porcentaje Ejecución:** Bavaria II - 32%  
**Porcentaje Ejecución:** Villa del Prado – 8%

# MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA Y ZONA RURAL

COP. 54 – 55 – 57 de 2016

Valor: \$ 1.750.038.784

Contratistas: EICON LTDA(\$473.843.532)

EME INGENIERIA S.A.(\$829.386.532)

IGS INGENIERIA E.U.(\$446.808.720)

Fecha de Inicio: Junio 16 de 2.016

Fecha de Terminación: Abril 15 de 2.017

Porcentaje de Ejecución: 90%

Estado: Ejecución

## SECTORES A INTEVENIR

- ❖ **GRUPO EICON** Intervienen: Comunas 1, 10, 11, 13, 16 y Corregimiento 2
- ❖ **GRUPO EME** Intervienen: Comunas 4, 5, 7, 12, 17, Corregimiento 3 y Viaducto Provincial
- ❖ **GRUPO IGS** Intervienen: Comunas 2, 3, 6, 8, 9, 14, 15 y Corregimiento 1

# PROCESOS ADJUDICADOS PROXIMOS A INICIAR

## SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED – ETAPA 1 COMUNA 2

<b>Valor:</b>	<b>\$ 1.181.332.040</b>
<b>Fecha de Adjudicación:</b>	<b>Marzo 22 de 2017</b>
<b>Contratista:</b>	<b>CELSA S.A.S</b>
<b>Barrios a Intervenir:</b>	<b>Esperanza I, II, III Villa Helena - San Cristóbal Vía Matanza desde CAI la Virgen Lizcano I y II Los Ángeles Mirador del Norte Norte Club.</b>



# PROCESOS ADJUDICADOS PROXIMOS A INICIAR

## SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED – ZONA CENTRO

<b>Valor:</b>	<b>\$ 388.033.824</b>
<b>Fecha de Inicio la instalación:</b>	<b>Abril 04 de 2017</b>
<b>Contratista:</b>	<b>ENERGÍA Y CONTROLES LTDA</b>
<b>Zona a intervenir:</b>	<b>Calle 33 a la Calle 37 Carrera 11 a la Carrera 19</b>



# PROCESOS PUBLICADOS EN LA PAGINA SECOP

## CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL TRAMO 4 CENTROABASTOS – CAFÉ MADRID

**Valor:** \$ 4.517.468.817  
**Proceso:** SI-LP-002-2017  
**Fecha de Adjudicación:** Mayo 23 de 2017  
**Plazo de Ejecución:** 5 meses

## INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED – ETAPA 1 COMUNA 2

**Valor:** \$ 268.068.622  
**Proceso:** SI-SAMC-001-2017  
**Fecha de Adjudicación:** Mayo 02 de 2017  
**Plazo de Ejecución:** 3 meses

## ACTIVIDADES DE PODAS PARA EL DESPEJE DE LUMINARIAS Y REDES QUE INTERFIERAN CON EL ALUMBRADO PÚBLICO

**Valor:** \$ 549.256.735  
**Proceso:** SI-SAMC-002-2017  
**Fecha de Adjudicación:** Abril 28 de 2017  
**Plazo de Ejecución:** 7 meses

## PROYECTOS EN PROCESO PRE-CONTRACTUAL PROXIMOS A PUBLICAR EN EL SECOP

<b>CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO – ETAPA 2 EN EL BARRIO CIUDAD BOLIVAR</b>	<b>\$ 1.696.085.045</b>
<b>MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CANCHAS DE LOS BARRIOS BETANIA, VILLALUZ CAMPESTRE, CAMPO MADRID, VILLA ALEGRÍA II, CANELOS, CRISTAL ALTO Y CRISTAL BAJO.</b>	<b>\$ 2.015.560.959</b>

## PROYECTOS EN PROCESO DE DISEÑO

**SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A LED, EN LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4 Y 5**

**ILUMINACIÓN INTERACTIVA EN LA CRA 22 – ZONA DEL CALZADO**

**ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA E INTERACTIVA – CALLE DE LOS ESTUDIANTES**

**ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA E INTERACTIVA – PLAZOLETA IMCUT**

**ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA – TANQUE DEL AMB PUERTA DEL SOL**

**ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y ARQUITECTÓNICA – PLAZA DE LOS EDECANES  
(Parque Casa Bolívar).**

**ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y ARQUITECTÓNICA – PARQUE MORRORICO**

**Ing. GLORIA A. DURAN VALDERRAMA**  
**Coordinadora Alumbrado Público**

**GRACIAS!!!**
